

# Übersicht Förderanträge 2023 bis 2030

Projekt	Ablaufplanung Förderverfahren und Bauablauf				
	AVWFL an StMGP	Aufnahme Bauprogramm	Baubeginn	Fertigstellung	
PSY BA1A+B	2021		Q2/2024	Q1/2027	
PSY BA1A		Juni 2022			
PSY BA1B	2022	Juni 2023			
PSY BA2	2023	Juni 2024	Q4/2028	Q1/2030	
TEN FTS	2023	Juni 2024	Q1/2026	Q3/2026	
TEN 0 Nord	2024	Juni 2025	Q2/2026	Q4/2028	
TEN 1 West *	2024	Juni 2025	Q2/2026	Q1/2031	
TEN 2 Energiezentrale	Flexibel (2027 /2028)	Flexibel (2028 /2029)	Flexibel	Flexibel	
TEN 3 Ost *	2026	Juni 2027	Q2/2028	Q1/2032	
TEN 4 Umbau U+B	2025	Juni 2026	Q4/2027	Q4/2031	
TEN 5 Abbruch Süd*	2029	Juni 2030	Q2/2032	Q4/2033	
TEN 6 Magistrale *	2030	Juni 2031	Q3/2032	Q4/2033	

\* Abwicklung gem. Zielplanung ARCASS mit West- und Osterweiterung



# Baumaßnahmen

- **Klinikum Ingolstadt – Generalsanierung (alle Projekte)**
  - KIGS-2 – ICU, IMC, SU, LHKM
  - KIGS-PSY – Neubau Psychiatrie
  - KIGS-TEN 0 – Teilersatzneubau Nord Mitte und Ost / Teilersatzneubau Nord
  - KIGS-TEN 1 – Teilersatzneubau West
  - KIGS-TEN 2 – Sanierung Energiezentrale
  - KIGS-TEN 3 – Teilersatzneubau Ost
  - KIGS-TEN 4 – Sanierung Untersuchung und Behandlung
  - KIGS-TEN 5 – Abbruch Süd
  - KIGS-TEN 6 – Neubau Magistrale
  - KIGS-NEA Süd – Erneuerung Netzersatzanlage, Mittelspannung USV
  - KIGS-Sprinkler – Erneuerung zweite Unerschöpfliche Quelle
  - KIGS-NEA Süd – Erneuerung Netzersatzanlage, Mittelspannung und Niederspannungshauptverteilung Süd
  - KIGS-Kälte – Erhöhung der Kälteleistung
- Psychiatrische Tagesklinik mit Ambulanz in Eichstätt
- Mitarbeiterwohnen

# Ablauf

Ablauf der Generalsanierung:

- Die Abfolge der einzelnen Maßnahmen der Generalsanierung war getaktet.
- Aufgrund von Anpassungen der Planungen ist eine neue Taktung aufzustellen.
- Grundsätzlich bleibt es erforderlich jedes Jahr einen Antrag auf Vorwegfestlegung beim Staatsministerium für Gesundheit und Pflege für ein Teilprojekt der GenSan einzureichen.
- Die Terminalschiene für die angepassten Projekte ist in 2023 noch festzulegen und ab 2024 abzuarbeiten.
- Anpassung im laufenden Prozess werden entsprechend vorgenommen (z.B. durch Strukturgutachten Region 10, Veränderungen durch die Neustrukturierung des Ministeriums für Gesundheit und Pflege o.ä.).

➤ Hinweise:

- Es muss jedes Jahr ein Antrag auf Vorwegfestlegung eingereicht werden, um das Gesamtziel der Fertigstellung „komplett“ Ende 20?? zu erreichen
- Eine Unterteilung seitens des StMGP in kleinere Förderabschnitte (analog PSY) ist nicht auszuschließen und würde die Gesamtfertigstellung entsprechend nach hinten verschieben
- Alle Bauabläufe sind recht ehrgeizig
- Die Entscheidungen zu Inhalten sind von den Geschäftsführern und Gremien entsprechend rechtzeitig zu treffen

# Klinikum Ingolstadt Generalsanierung

KIGS-2

- 1 -

Intensivstationen, Inter-Mediate-Care-Stationen, Stroke Unit,  
Linksherzkathetermessplatz

Fertigstellung des Bauabschnittes 2-1 (West) ist für März 2024 geplant; danach erfolgen die Umzüge der bestehenden Intensivstationen in die neuen Flächen.

Die Umbaumaßnahmen des BA2-2 erfolgen direkt daran im Anschluss und sollen Anfang 2026 abgeschlossen sein.

Durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird den Baupreisen durch Indexierung auf Mitte Bauzeit Rechnung getragen.

## KIGS-TEN ALLE


### Generalsanierung Klinikum Ingolstadt mit Teilersatzneubauten

Probleme mit der Gründung im TEN-West (1) und damit zusammenhängende erforderliche statische Anpassungen sowie die gestiegenen Flächenanforderungen der Apotheke im Gegensatz zur ursprünglichen Planung der Gen San (Lagerhaltung 6 statt 2 Wochen, Unit-Dose, Hygieneabstände) haben dazu geführt, dass Labor und Apotheke nicht in diesem Bauabschnitt / Bauteil (in Ebene E01) untergebracht werden können.

Hier mussten und müssen neue Lösungen gefunden werden.

Kritisch wird aktuell nun doch die Wegesituation (lange Wege) der bisher vorgesehenen somatischen Pflegestationen (gerade im Bereich Pflegestationen Ost) zu Notfallzentrum, OP und Intensivbereichen gesehen.

Hier soll im Planungsfortschritt eine entsprechende Prüfung von Alternativen und Optionen erfolgen. Abgaben von Vorwegfestlegungen sind aktuell noch nicht absehbar.

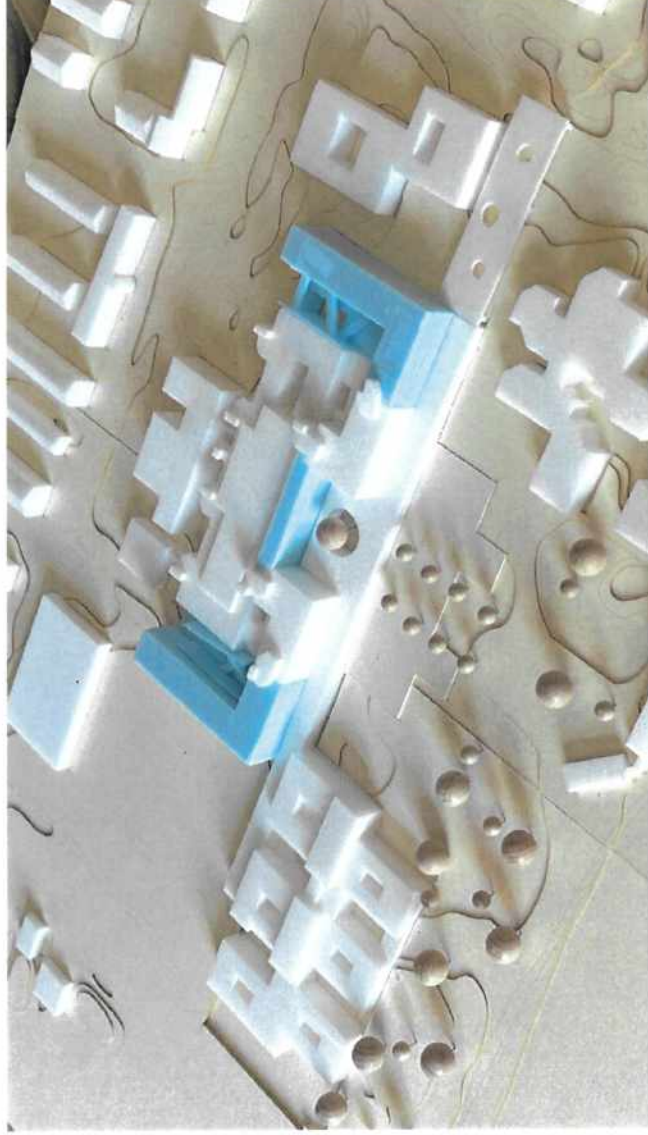

## KIGS-NEA Süd

### Erneuerung der Netzersatzanlage Süd, Mittelspannungshauptverteilung und unterbrechungsfreier Stromversorgung

Die vorhandene NEA-Süd mit MSHV und USV ist mittlerweile 40 Jahre alt und muss ausgetauscht werden. Der nachgewiesene und anerkannte Vollverschleiß gilt auch für diese Anlagenteile. Es wurde Anfang 2022 eine Antrag auf Austausch im Rahmen einer Regierungskontingentmaßnahme gestellt.

Dem Prüfergebnis wurde mehrfach widersprochen; den Widersprüchen wurde letztendlich stattgegeben und mit der Maximalsumme im Rahmen eines Regierungskontingentes entsprochen (mehr als 800.000.€ mehr als in der Erstbewertung der ROB wurden letztendlich genehmigt).

Baubeginn	2023	
Fertigstellung	2025	
Kosten – gesamt	3.837.041 €	
Förderung	2.500.000 € - Quote 66 %	

## KIGS-Sprinkler

### Neue zweite unerschöpfliche Quelle für die Sprinkleranlage

Die vorhandene sogenannte zweite unerschöpfliche Quelle (Wasser des Schwimmbeckens im Bestandsgebäude der Psychiatrie) zur Wasserversorgung der im Brandschutzkonzept erforderlichen Sprinkleranlage für das gesamte Gebäude fällt mit dem Neubau der Psychiatrie und dem damit zusammenhängenden Abbruch der bestehenden Psychiatriegebäude mit Schwimmbad / Schwimmbecken weg.

Dieses Wasservolumen muss vor Abbruch neu an anderer Stelle geschaffen werden. Es wurde eine Voranfrage bei der Regierung von Oberbayern zu einer Maßnahme im Rahmen eines Regierungskontingents gestellt. Eine Bewertung dazu steht noch aus.

Baubeginn	2024
Fertigstellung	2025

Kosten HH 2023 – gesamt 2.700.000 €  
(Vorläufig angenommene Förderquote 60 %)

## KIGS-Kälte

### Erhöhung der Kälteversorgung im Vorgriff auf alle Baumaßnahmen KIGS-TEN und KIGS-PSY

Die vorhandene Kälteleistung muss für die zukünftigen Bedarfe erhöht werden.

Die Leistung ist v.a. für die redundante Kälteversorgung und z.T. bereits für den in 2026 fertiggestellten BA1 a+b des Psychiatrieneubaus erforderlich.

Baubeginn	2024/2025
Fertigstellung	2025/2026
Kosten – gesamt	3.000.000 €
Förderquote	ca. 60 %



## KIGS-PSY

### Neubau Psychiatrie

- 2 -

Auf Anforderung des StMGP wurde die Baumaßnahme Neubau Psychiatrie in 3 Förderabschnitte aufgeteilt, wovon der BA 1A und B gleichzeitig errichtet werden sollen. Gesamtkosten 142 Mio. EUR davon gefördert rund 70 %

Antrag	2021
Baubeginn	Ende 2023 (Vorabmaßnahmen) 1./2. Quartal 2024 Rohbau
Fertigstellung	BA1a+b: ca. September 2027



TK-EI

## Neubau Psychiatrische Tagesklinik mit Ambulanz in Eichstätt

Der Bau der neuen Psychiatrischen Tagesklinik mit Ambulanz in Eichstätt wurde mit den Abbruchmaßnahmen begonnen. Im August beginnen die Baumeisterarbeiten. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 Anfang 2025 vorgesehen.

Baubeginn	2023
Fertigstellung	2024/2025

Kosten: rd. 4.703.000 €, Förderquote: 51,55 %

